



Faculdades Integradas de Taquara

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.072, de 26/12/14, D.O.U. de 29/12/14.
Mantida pela Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste - FEEIN, CNPJ 97.763.593/0001-80.

PLANEJAMENTO DE TAREFAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PROJETO II

Estudante: Jackson Matiazzi

Projeto: FaccuPoint: ferramenta gamificada de quiz

1. Visão geral da entrega final

O projeto encontra-se no PDS II (2026), com documentação de projeto alinhada ao modelo institucional (tema, problema, fundamentação, metodologia, cronograma macro, recursos e apêndices A–C com requisitos e modelagem).

Estado atual (referência): documento de projeto e especificação de requisitos consolidados; diagramas de apoio; critérios de aceite por ciclo vinculados ao Apêndice B.

Composição da entrega final planejada (100%): aplicação desktop para condução de quizzes gamificados em sala de aula, com cadastro de quizzes (unicidade semântica por docente proprietário e reuso por referência), sessão com código ou QR Code, tempo de resposta, fluxo automatizado entre etapas, ranking, persistência local (SQLite) e demais requisitos do Apêndice B; evidências de testes em sala; integrações previstas no cronograma (servidor local, eventual sincronização remota e envio de resultados por e-mail), conforme evolução do escopo; executável ou pacote de instalação para ambiente Windows do laboratório; repositório remoto de código para rastreabilidade das versões, quando utilizado.

Ferramentas de acompanhamento: utiliza-se um quadro Kanban na plataforma Trello (Figura 1), com colunas que organizam o fluxo de trabalho (incluindo backlog, tarefas em fila, execução, documentação e concluídos), cartões identificados por código alfanumérico vinculado a marcos do cronograma e etiquetas por fase ou tipo de atividade.

2. Cronograma de encontros e metas parciais

Entrega inicial: linha de base (Baseline)

Data limite: 28/03

Tarefa principal: adequação do documento de requisitos/projeto ao novo modelo institucional da FACCAT e consistência com os apêndices (requisitos, regras de negócio e modelagem).

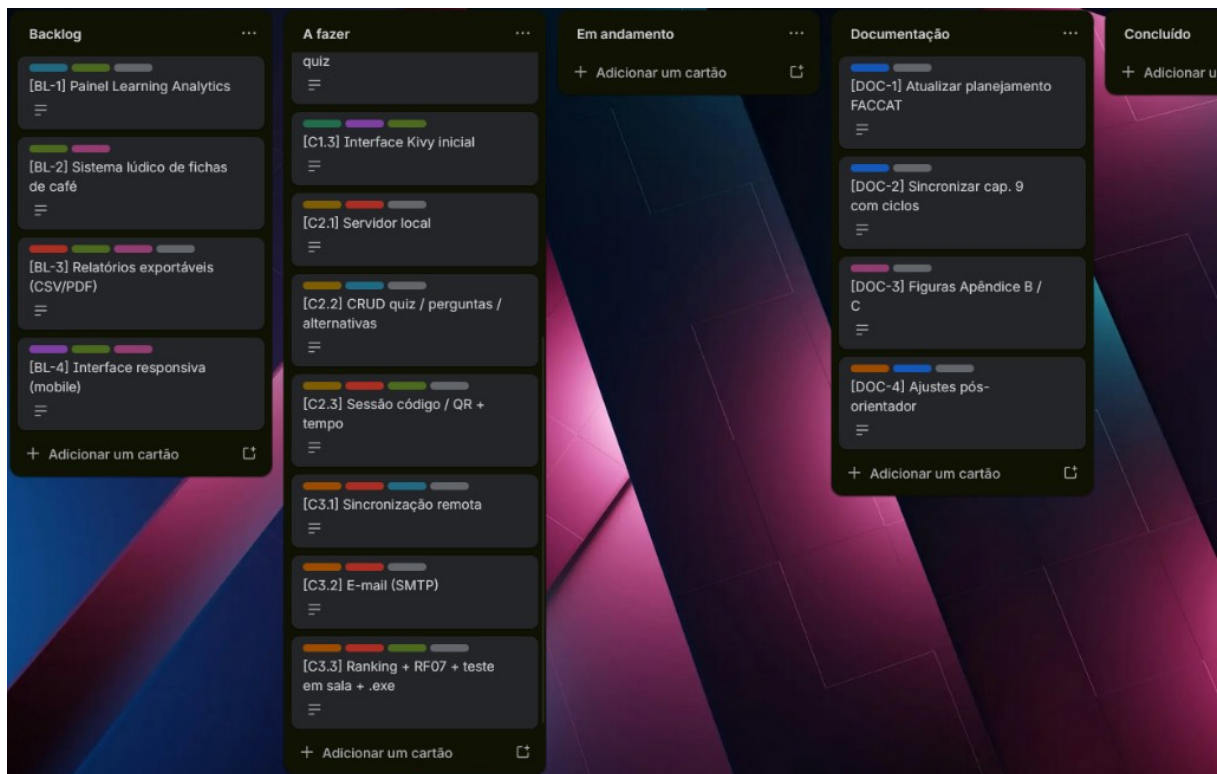


Figura 1: Quadro Kanban do projeto na plataforma Trello: colunas, cartões com identificador de marco (ex.: C1.2) e etiquetas por fase.

Ciclo 1: primeiro acompanhamento

Período de desenvolvimento: 28/03 a 09/04

Data do encontro (checkpoint): 09/04 (quinta-feira), conforme calendário acordado com a turma.

Ciclo 2: segundo acompanhamento

Período de desenvolvimento: 10/04 a 14/05

Data do encontro (checkpoint): 14/05 (quinta-feira), conforme calendário acordado com a turma.

Ciclo 3: terceiro acompanhamento

Período de desenvolvimento: 15/05 a 24/06

Data do encontro (checkpoint): 24/06 (quarta-feira), conforme calendário acordado com a turma.

Instruções (conforme modelo institucional)

1. Preencher ou ajustar as tabelas com tarefas claras e mensuráveis, alinhadas ao orientador.

ID	Descrição da tarefa (o que será desenvolvido?)	Resultado esperado (o que será demonstrado?)
1.1	Configuração do ambiente de desenvolvimento (Python, Kivy, SQLite, editor e controle de versão).	Ambiente funcional; repositório criado; dependências instaladas.
1.2	Modelagem de dados local: entidades de quiz com <code>titulo_normalizado</code> , restrição de unicidade por docente proprietário; migração ou inicialização do esquema no banco.	Tabelas criadas no SQLite; DER ou esquema coerente com o Apêndice C.
1.3	Protótipo da interface (Kivy): telas iniciais navegáveis (ex.: abertura, criação/edição básica de quiz, fluxo mínimo).	Aplicação abre e permite navegar entre as telas definidas para o Ciclo 1.

- No dia do encontro, estar preparado para abrir o código/software e demonstrar o que consta em **Resultado esperado**.
- O somatório das tarefas deve cobrir a evolução necessária para atingir pelo menos **80%** de conclusão exigidos no Seminário de Andamento (meta: 100% quando possível).

ID	Descrição da tarefa	Resultado esperado
2.1	Servidor local (ex.: HTTP/FastAPI ou equivalente) para receber respostas dos participantes na rede local durante a sessão.	Servidor em execução na máquina do docente; teste de POST ou fluxo equivalente documentado.
2.2	CRUD completo de quizzes, perguntas e alternativas persistido no banco local, com validação de título normalizado e regras do RF08/RF09.	Criação de quiz com múltiplas questões; dados verificáveis no SQLite.
2.3	Fluxo de sessão: docente inicia sessão (código ou QR Code); participante ingressa e envia resposta em tempo real.	Demonstração com ao menos dois dispositivos na mesma rede.

ID	Descrição da tarefa	Resultado esperado
3.1	Sincronização assíncrona dos dados da sessão com repositório remoto (ex.: Supabase/PostgreSQL) ao encerramento, quando aplicável ao escopo.	Log ou evidência de registros inseridos/atualizados no ambiente remoto após sessão de teste.
3.2	Envio automático de relatório de resultados por e-mail (SMTP) ao docente, conforme RF de apoio definidos no projeto.	E-mail recebido com resumo da sessão de teste (conteúdo mínimo acordado com o orientador).
3.3	Ranking ao término da sessão; automação do fluxo do participante (RF07); testes em sala com evidências; empacotamento para distribuição (ex.: .exe para Windows).	Ranking operacional; fluxo automático demonstrável; registro fotográfico ou log; executável gerado ou instruções de build documentadas.
